


Versetzanleitung für Mobiplan Verkehrsinseln

- Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Verkehrsrechtliche Anordnung, Regelplänen, Beschilderungen, etc. **(Bauseitige Leistung)**)
- Ausmessen und Markieren der Lage der Mobiplan – Verkehrsinselteile
- Abladen und Ausrichten der Fertigteile (z. B. mit Kranfahrzeug)
- Im Bereich der Befestigungsanker müssen auf der Unterseite der Fertigteile die Neoprenaufleger (250/150/10 mm) angebracht werden (bei Halbkreisförmigen Betonfertigteilen 3 Stück bzw. bei Rechteckigen Betonfertigteilen 4 Stück, z. B. mit Silikon).
- Falls der Fahrbahnbelag uneben ist, kann es erforderlich sein, dass zusätzliche Neoprenaufleger als Höhenausgleich eingebaut werden müssen.
- Beim Ausrichten der Fertigteile ist darauf zu achten, dass ein Abstand von mindestens 1 – 1,5 cm zwischen den einzelnen Fertigteilen vorhanden ist (evtl. Neoprenstreifen als Abstandshalter einlegen).
- Wenn die Fertigteile fertig ausgerichtet sind, kann mit den Bohrarbeiten für die Verankerung begonnen werden.
- Die Bohrdurchmesser und die erforderlichen Bohrtiefen entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben der Anker (für die von uns mitgelieferten Anker sind die Angaben beigefügt).
- Der Bohrstaub ist aus den Bohrlöchern zu Entfernen (z. B. durch Ausblasen).
- Beim Setzen der Anker sind die Herstellerangaben zu beachten. Klebepatrone einsetzen - Gewindestange eindrehen – Mutter für M 16 mit der Unterlagsscheibe DN 50 mm und schwarzer Gummi Unterlegscheibe (EPDM) DN 50 mm anziehen.
- Kunststoffdeckel (DN 60 mm) in die Aussparung oberhalb der Mutter einlegen (evtl. mit Silikon befestigen)
- Kunststoffdeckel für die Versetzanker eindrücken (z. B. für RD 12)
- Bei Mitlieferung der Beschilderung wird im Anschluß an die Inselmontage der Rohrfosten in der Bodenhülse eingesetzt und verschraubt.
- Befestigung der Verkehrsleitsäule am Rohrfosten mit den mitgelieferten Rohrschellen, incl. Schraubmaterialien.
- Befestigung des Verkehrszeichens (z. B. VZ 222) am Rohrfosten mit den mitgelieferten Befestigungsteilen.

Montagehinweis Mobiplan



Ausmessen und Lage
Markieren

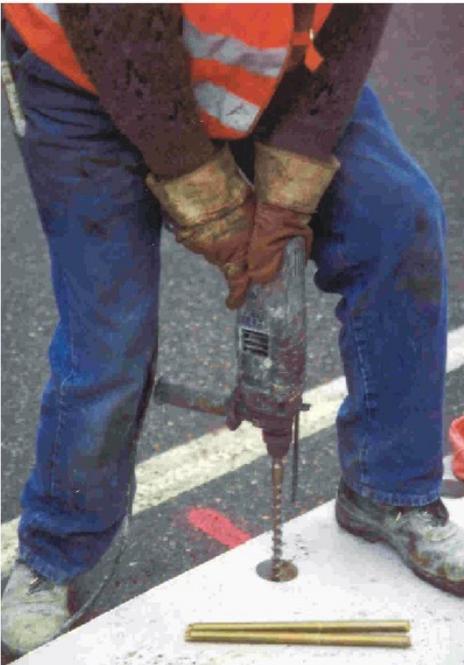

Bohrungen für die Verankerungen herstellen
Bitte die Angaben des Herstellers beachten!
-Bohrtiefe beachten und
-Bohrloch ausblasen

Stand: Mai 2010

Neoprenlager befestigen



Verkehrinsel absetzen



Betonteile mit den
Gewindestangen
Befestigen

